

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (สูง 3 ชั้น) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฐานรากเสาเข็มตอก)
และสิ่งก่อสร้างประกอบ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่น ๆ ถือราคา
เหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน ออกเป็นทั้งหมด 27 งวดงาน ประกอบด้วย

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 2.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
งานผังบริเวณ
- ถมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นตามเกณฑ์ งานทางเข้า แล้วเสร็จ 50%
- ถมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นตามเกณฑ์ บริเวณภายใน แล้วเสร็จ 50%
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 1.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
งานผังบริเวณ
- ถมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นตามเกณฑ์ งานทางเข้า แล้วเสร็จ 90%
- ถมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นตามเกณฑ์ บริเวณภายใน แล้วเสร็จ 90%
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 1.60 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น
- เจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างเสาเข็มพร้อมทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 65 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 2.15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น
- หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาดอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตถึงเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 85 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

สัญญา ๒๕๖๒

หน้าลงนาม

งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 3.25 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้น ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสารับคาน ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- ทำระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถึงเกราะ สำเร็จรูป แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 2.10 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้น ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสารับคาน ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 125 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 2.10 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้น ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสารับคาน ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 145 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง


 President

 Vice President

 Secretary

 Treasurer

งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 4.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- หล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมันกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 165 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 9 เป็นเงินร้อยละ 4.55 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- มุงกระเบื้องหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา, ติดตั้งเชิงชายและทับเชิงชายไม้ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งวงกบไม้ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 90%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าในผนัง ชั้น 1 ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 185 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 10 เป็นเงินร้อยละ 3.20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- ติดตั้งวงกบไม้ ชั้น 3 แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังชั้น 3 และชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลังที่เหลือ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 3 ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าในผนัง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ 90%
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %
- ฉาบปูนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 205 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

๒๓. ๑๓ ๘.๘
วิ
เจ้าหน้า
หน้างาน

งวดที่ 11 เป็นเงินร้อยละ 2.80 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายใน ชั้น 1 ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อพร้อมร้อยสายระบบสัญญาณต่าง ๆ ชั้น 1 ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อพร้อมร้อยสาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 1 ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อลงระบบปรับอากาศ ชั้น 1 ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- งานตกแต่งผิวผนังห้องน้ำ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 225 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 12 เป็นเงินร้อยละ 1.50 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายใน ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อพร้อมร้อยสายระบบสัญญาณต่าง ๆ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อพร้อมร้อยสาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อลงระบบปรับอากาศ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- งานตกแต่งผิวผนังห้องน้ำ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 245 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 13 เป็นเงินร้อยละ 2.55 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานภายใน ชั้น 2 ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ตกแต่งผิวพื้นชั้น 2 ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%

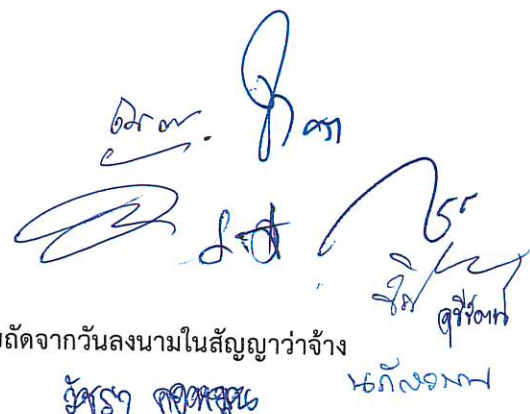







กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 265 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 14 เป็นเงินร้อยละ 3.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90%
- ตกแต่งผิวพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ตกแต่งเคาน์เตอร์ คสล. ผิวปูหินแกรนิต 0.60 ม. แล้วเสร็จ
- ตกแต่งเคาน์เตอร์ คสล. ผิวปูหินแกรนิต 0.50 ม.(ห้องรับเรื่อง) แล้วเสร็จ
- ตกแต่งซิงล้างจาน 2 หลุมพร้อมที่คว่ำจาน แล้วเสร็จ
- ตกแต่งบันได ราวบันได ติดตั้งบันไดลิง ราวกันตก แล้วเสร็จ 90%
- งานทาสีรองพื้นผนังภายใน ภายนอก และฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 285 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง


ผู้รับจ้าง: 
ผู้ตรวจการ: 
ผู้ควบคุม: 
ผู้ตรวจการ: 
ผู้ควบคุม: 
ผู้ตรวจการ: 
ผู้ควบคุม: 

งวดที่ 15 เป็นเงินร้อยละ 4.60 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- ตกแต่งผนังอูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงบังแดดอูมิเนียม แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 305 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 16 เป็นเงินร้อยละ 4.85 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- ติดตั้งประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 315 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 17 เป็นเงินร้อยละ 7.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งระบบโคมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 330 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 18 เป็นเงินร้อยละ 6.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัฒนาระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งลิฟท์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 345 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง


ผู้รับจ้าง
ผู้ตรวจการ
ผู้ควบคุมงาน
ผู้รับมอบหมาย

งวดที่ 19 เป็นเงินร้อยละ 2.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก ภายในโครงการ แล้วเสร็จ 50%
- ก่อสร้างถนนคสล. ลานคสล. คันหิน ทางเท้า ภายในโครงการ แล้วเสร็จ 50%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 355 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 20 เป็นเงินร้อยละ 2.15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อบัก ภายในโครงการ แล้วเสร็จ 90%
- ก่อสร้างถนนคสล. ลานคสล. คันหิน ทางเท้า ภายในโครงการ แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 21 เป็นเงินร้อยละ 2.80 ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก ภายนอกโครงการ แล้วเสร็จ 90%
- ก่อสร้างถนนคสล. ภายนอกโครงการ แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 375 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 22 เป็นเงินร้อยละ 3.25 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 2 หลัง แล้วเสร็จ 90%
- ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 385 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 23 เป็นเงินร้อยละ 3.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ทำป้ายชื่อโครงการ แล้วเสร็จ 90%
- ก่อสร้างเสาธง แล้วเสร็จ 90%
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้) แล้วเสร็จ 90%
- งานเดินท่อประปาภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งมิเตอร์น้ำ จากการประปา แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 400 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'Q' or '2', a checkmark, and various other scribbles and initials.

งวดที่ 24 เป็นเงินร้อยละ 4.10 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 410 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 25 เป็นเงินร้อยละ 4.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

- ติดตั้งมานปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องประชุม 40 ที่นั่ง แล้วเสร็จ
- ระบบโสตทัศนูปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ







กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

งวดที่ 26 เป็นเงินร้อยละ 2.50 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

อาคารเก็บพัสดุ

- ทำการก่อสร้างเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 1 พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- หล่อโครงสร้างอาคารส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- มุงกระเบื้องหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา, ติดตั้งเชิงชายและทับเชิงชายไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน - ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ พร้อมบานประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสวิทช์ เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 430 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

อ.ดร. 
ส.ดร. 
อ.ดร. 
อ.ดร. 
อ.ดร. 
อ.ดร. 
อ.ดร. 
